

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司 关于舒坪园区工业冷凝水外排治理情况 总结报告

自贡市环境保护局：

根据市环保局要求制盐区外排工业冷凝水 Cl⁻必须达标排放。为了加强园区环境保护工作，确保工业冷凝水达标排放。现将舒坪园区存在的问题以及整改情况报告如下：

一、舒坪园区目前现状及存在的问题

1、目前现状：

(1)2008 年投产后，长期雨水渗透地面下沉，沟、池损坏泄漏。

(2)因资金原因得不到有效保障，设备锈蚀损坏不能及时维修更换。

(3)外排工业冷凝水混入含 Cl⁻含量较高的设备跑冒滴漏废水。

2、存在的问题：

(1)一号真空：回收池淤泥沉积、泄漏，沸腾床散水回收沟损坏，地面下沉排水沟道损坏。

(2)二号真空：沸腾床地面散水回收池损坏，排水沟道损坏泄漏。

(3)卤水净化：无地面散水回收沟，卤灌下回收池淤泥沉积、泄漏。

(4)设备锈蚀、跑冒滴漏严重。

(3)对地面积盐清扫回收化水，尽量避免散盐仓的成品盐流失在公路上。

二、外排水的治理整改项目：总费用 51.46 万元

1、长山盐矿卤水净化整改项目：整改资金 14.89 万元

(1)在卤水净化周边修建围堰、排水沟道、回收池，在卤灌外修建围墙；

(2)对腐蚀严重的设备、闸阀、管道进行维修更换。

2、原盐分厂整改项目：整改资金 36.57 万元

(1)一、二真空沸腾床、湿皮带下地面积盐由当班员工回收送到化咸池集中处置。

(2)二号真空旋风除尘：修建围堰、排水沟，挖回收池集中处置含盐废水。

(3)一号真空零米层：挖回收池集中回收含盐废水。

(4)卤水净化：清理修复现有沟道，新挖回收池对泄漏的卤水集中回收。

(5)板框压滤机：新建沟道、挡水墙，清理堵塞的排水沟。

(6)修建化咸池集中处置回收渣盐。

2016 年 12 月 1 日市环保局安排市环境监测中心站对舒坪园区总排口外排水取样监测，2016 年 12 月 15 日市环境监测中心站出具的监测报告舒坪园区外排水各类污染因子均达标排放。

特此报告

四川久大制盐有限责任公司自贡分公司

2017 年 1 月 3 日




一、卤水净化照片





二、一号真空照片

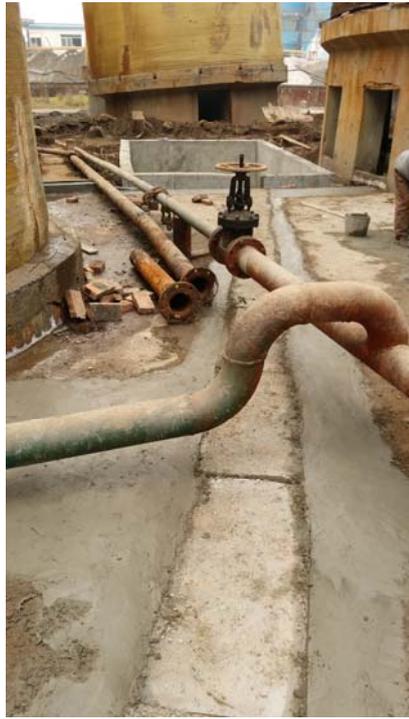

三、二号真空照片



地面渣盐化咸池

